



# POWIAT PRZASNYSKI

**Działania podjęte i wykonane  
przez Powiat Przasnyski  
w sprawie realizacji:**

- ❖ **Przebudowy drogi  
wojewódzkiej nr 614.**
- ❖ **Uzbrojenia PSG w Chorzelach.**






## Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Chorzeliach - *Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - Etap III – analiza przetargów:*

Nr edycji	Data czynności	Czynność	Opis czynności
I	29.05.2018	Ogłoszenie o zamówieniu	Roboty budowlane na odcinku 2B: 1. Budowa drogi powiatowej o długości 1,399 km; 2. Budowa infrastruktury technicznej: a) branża sanitarna - kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa; b) branża elektryczna; c) branża kolejowa (bocznica kolejowa); d) branża telekomunikacyjna. Roboty budowlane na odcinku 2C: 1. Budowa drogi powiatowej o długości 0,986 km; 2. Budowa infrastruktury technicznej: a) branża sanitarna - kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa; b) branża elektryczna; c) branża telekomunikacyjna.
	04.07.2018	Otwarcie ofert	Wpłynęła jedna oferta za cenę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych OSTRADA Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 23 660 374,56 zł brutto
	05.07.2018	Unieważnienie zamówienia	Do niniejszego postępowania w terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych OSTRADA Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka za cenę 23 660 374,56 zł brutto, która przewyższyła kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.



## Edycja I: Analiza cen wg złożonej oferty i Kosztorysu Inwestorskiego:

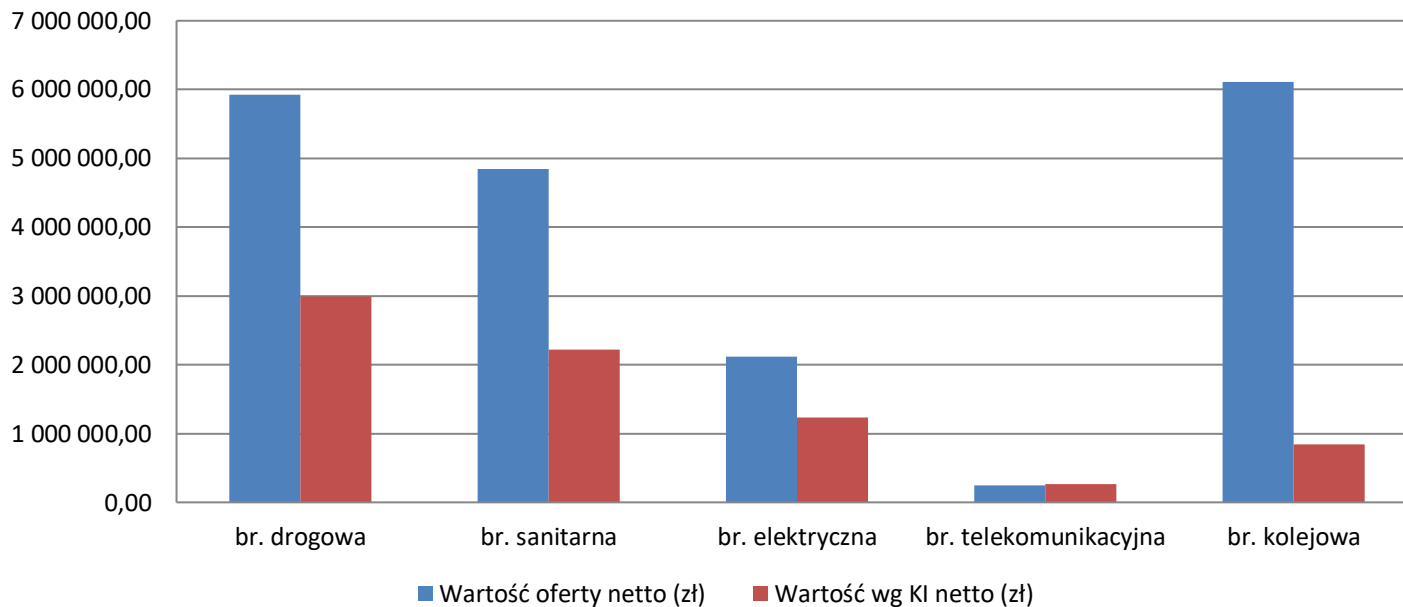




II	04.08.2018	Ogłoszenie o zamówieniu	Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Część 1 zamówienia obejmowała: 1. Budowę drogi powiatowej na odcinku 2B i odcinku 2C o długości ok. 2,39 km; 2. Budowa infrastruktury technicznej na odcinku 2B i odcinku 2C: a) branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa); b) branży elektrycznej; c) branży telekomunikacyjnej. Część 2 zamówienia obejmowała roboty budowlane branży kolejowej - budowę bocznic kolejowej.
	14.09.2018	Otwarcie ofert	Wpłynęły następujące oferty: Część 1 zamówienia: 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki za cenę 22 887 978,78; 2. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków za cenę 25 587 935,64 zł; 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "OSTRADA" Sp. z o.o., ul. Lokalna 3, 07-410 Ostrołęka za cenę 15 763 921,66 zł. Część 2 zamówienia: 1. DOMOST Sp. z o.o. ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna 6 149 715,10 zł; 2. GÓR –TOR Maciej Górniak, Olszewo-Bołaki 17, 06-561 Stupsk za cenę 3 230 256,44 zł; 3. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków za cenę 4 313 556,06 zł
	27.09.2018	Unieważnienie Części 1 zamówienia	Cena oferty z najniższą ceną brutto tj. 15 763 921,66 zł przewyższa kwotę brutto jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie Zamówienia.
	15.11.2018	Podpisanie umowy na realizację Części 2 zamówienia - budowę bocznic kolejowej z Wykonawcą: Gór-Tor Maciej Górniak, Olszewo Bołaki 17, 06-551 Stupsk.	Wartość Umowy : 3 230 256,44 zł. Umowa została zrealizowana 29.05.2019 roku.
	29.07.2019	Wystąpienie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych	Wniosek o zaakceptowanie dokonania zmian w zakresie robót budowlanych branży drogowej i zmianę terminu rzeczowej i finansowej realizacji Projektu.



## Edycja II: Analiza cen wg złożonych ofert i Kosztorysu Inwestorskiego:

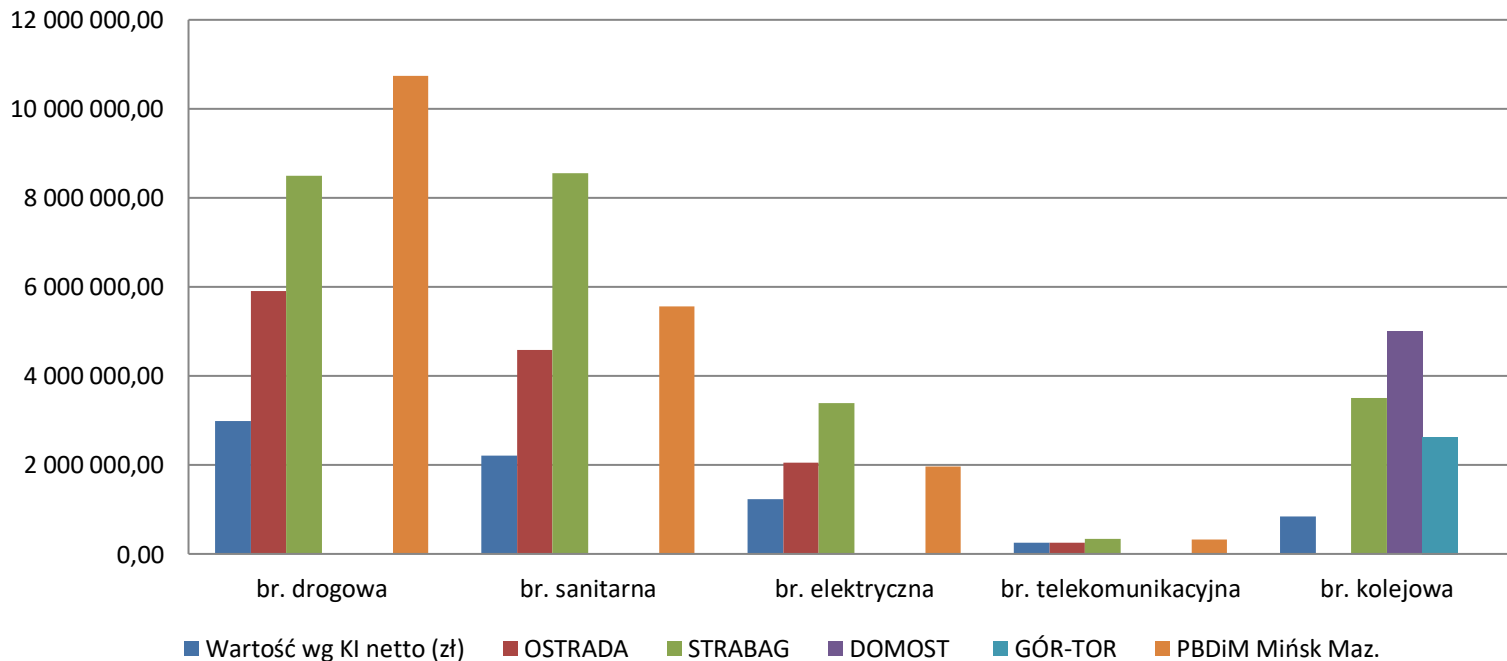




III	23.01.2020	Ogłoszenie o zamówieniu	Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Część 1 zamówienia obejmowała budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku 2B oraz 2C o długości około 2,399 km. Część 2 zamówienia obejmowała budowę infrastruktury technicznej na odcinku 2B: a) branża sanitarna - kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa; b) branża elektryczna; c) branża telekomunikacyjna. Część 3 zamówienia obejmowała budowę infrastruktury technicznej na odcinku 2C: a) branża sanitarna - kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa; b) branża elektryczna; c) branża telekomunikacyjna
	13.02.2020	Otwarcie ofert	Wpłynęły następujące oferty: 1) Część 1 zamówienia: 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.- Lider, Pełnomocnik ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki; ALTOR Sp. z o.o. – Partner ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki za cenę 8 067 528,81 zł; 2. Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice 76 , 06-100 Pułtusk za cenę 8 554 432,90 zł ; 3. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe URBANOWSKI Zenon Urbanowski ul. Przasnyska 75, 06-200 Maków Mazowiecki za cenę 5 987 563,75 zł; 4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. ul. Lokalna 2 , 07-410 Ostrołęka za cenę 7 932 119,24 zł. 2) Część 2 zamówienia: Dla części 2 zamówienia nie złożono żadnej oferty. 3) Część 3 zamówienia: 1. Bruktim Usługi budowlano- projektowe Sylwester Barański ul. Żniwna 15A, 07-410 Ostrołęka za cenę 1 557 107,61 zł. 2. Gutbruk inż. Tomasz Gutowski Kaki Mroccki 18, 06-316 Krzynowłoga Mała za cenę 1 551 109,21 zł.
	04.03.2020	Unieważnienie Części 2 zamówienia	W przedmiotowym postępowaniu, dla części 2 zamówienia nie złożono żadnej oferty.
	13.03.2020	Podpisanie umowy na realizację Części 3 zamówienia - budowę infrastruktury technicznej na odcinku 2C z Wykonawcą Gutbruk inż. Tomasz Gutowski Kaki Mroccki 18, 06-316 Krzynowłoga Mała.	Wartość umowy: 1 551 109,21 zł. Umowa została zrealizowana 04.09.2020 roku.
	24.03.2020	Unieważnienie Części 1 zamówienia	Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.



## Edycja I, II i III: Analiza cen wg złożonych ofert i Kosztorysu Inwestorskiego:

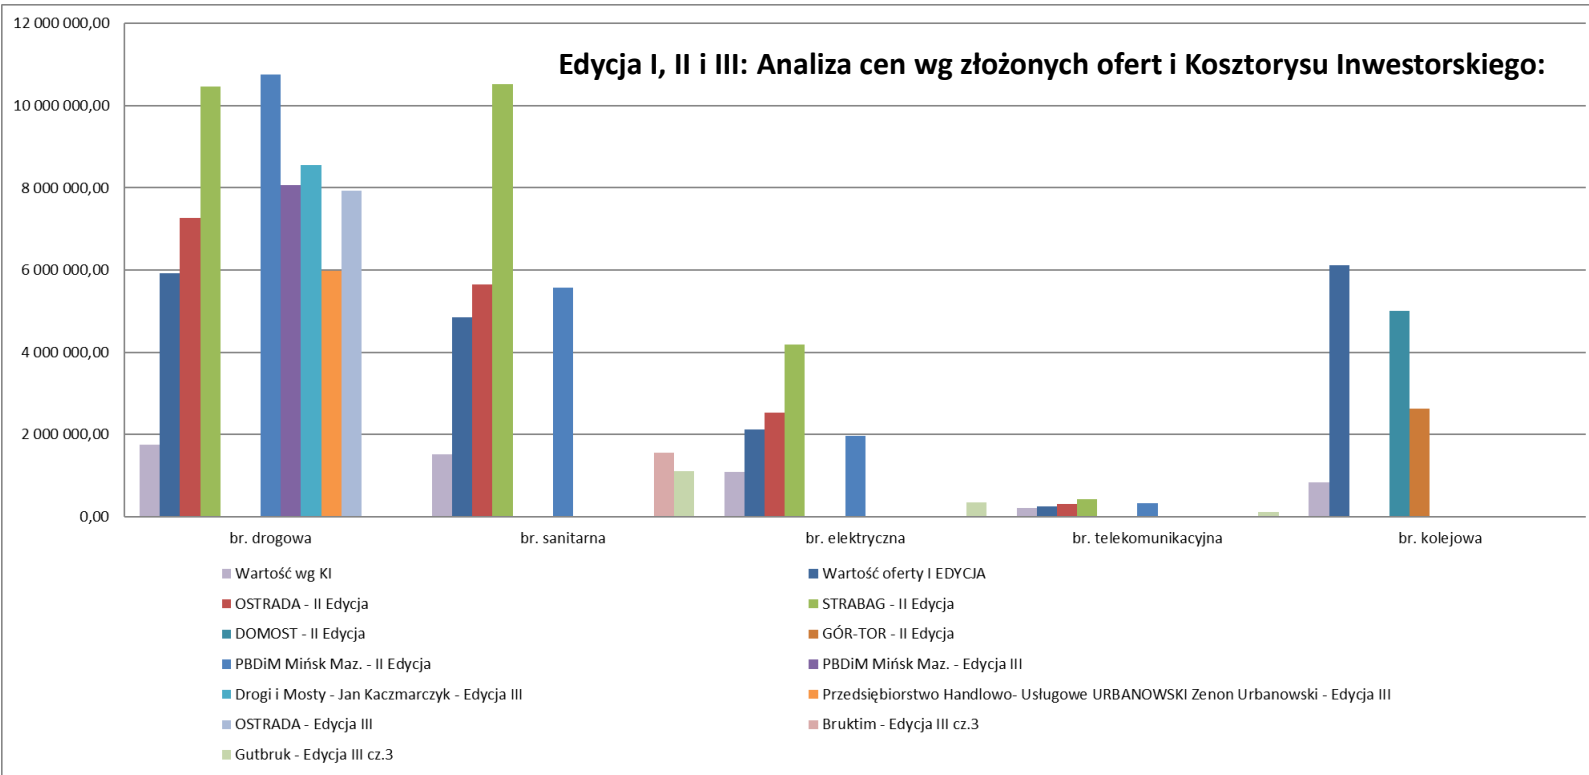



IV	28.09.2021	Ogłoszenie o zamówieniu	Zamówienie obejmowało budowę infrastruktury technicznej na odcinku 2B: a) branża sanitarna polegająca na wykonaniu kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
	14.10.2021	Otwarcia ofert	Wpłynęła następująca oferta: 1. GUTBRUK inż. Tomasz Gutowski, Kaki Mroczyki 18, 06-316 Krzynowłoga Mała za cenę 3 858 533,32 zł.
	27.10.2021	Unieważnienie zamówienia	Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.





## Wnioski:

### Roboty budowlane dla zakresu 2B:

1. Budowa drogi powiatowej o długości 1,399 km	Nie zrealizowano. Cena za wykonanie budowy drogi powiatowej przewyższyła kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
2. Budowa infrastruktury technicznej:	
a) Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć gazowa	Nie zrealizowano. Cena za wykonanie branży sanitarnej przewyższyła kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
b) Branża elektryczna	Nie zrealizowano. Cena za wykonanie branży elektrycznej przewyższyła kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
c) Branża kolejowa	Zrealizowano na podstawie zawartej Umowy na realizację Części 2 zamówienia - budowę bocznicy kolejowej z Wykonawcą: Gór-Tor Maciej Górniak, Olszewo Bołąki 17, 06-551 Stupsk.
d) Branża telekomunikacyjna	Nie zrealizowano. Cena za wykonanie branży telekomunikacyjnej przewyższyła kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

### Roboty budowlane dla zakresu 2C:

1. Budowa drogi powiatowej o długości 0,986 km.	Nie zrealizowano. Cena za wykonanie budowy drogi powiatowej przewyższyła kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
2. Budowa infrastruktury technicznej:	
a) branża sanitarna - kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa	Zrealizowano na podstawie zawartej Umowy na realizację Części 3 zamówienia - budowę infrastruktury technicznej na odcinku 2C z Wykonawcą Gutbruk inż. Tomasz Gutowski Kaki Mroczi 18, 06-316 Krzynowłoga Mała.
b) branża elektryczna	
c) branża telekomunikacyjna	



Wykonano bocznice kolejową i uzbrojenie terenu na odcinku 2 c.



## Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 614

Wykaz działań/czynności podejmowanych i wykonanych przez Powiat Przasnyski w przedmiocie realizacji umowy nr 253.2.2021.DW614 o roboty budowlane z dnia 26.05.2021 dotyczącej wykonania zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń, a także budowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 614 do parametrów drogi klasy G o przybliżonej długości 17,533 km, od km 0+000,00 do km 17+533,00”, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 04.04.2022 r., Aneksem nr 2 z dnia 14.07.2022 r. (dalej jako "Umowa DW614")

Lp.	Data sporządzenia pisma	Przedmiot	Odcinek
1.	2021.02.10	Wystąpienie do MJWPU z wnioskiem o zwiększenie wartości projektu do wartości otrzymanej w postępowaniu przetargowym	
2.	2021.04.22	Przesłanie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu do MJWPU (wniosek po zwiększeniu wartości projektu)	
3.	2021.05.06	Wystąpienie do Skarbnika Powiatu o przekazanie załączników do podpisania umowy o dofinansowanie projektu: m.in. Zaświadczeń z ZUS, US, banku o wyodrębnionych rachunkach bankowych dedykowanych obsłudze finansowej projektu	
4.	2021.05.17	Przesłanie załączników do podpisania umowy o dofinansowanie projektu z MJWPU	
5.	2021.05.18	Uzupełnienie załączników do umowy o dofinansowanie projektu	
6.	2021.05.21	Podpisanie Umowy nr RPMA.07.01.00-14-i459/21-00 o dofinansowanie projektu z MJWPU	



7.	2021-05-24	Wezwanie Wykonawcy do podpisania Umowy DW614 i wyznaczenie terminu na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy	I-VI
8.	2021-05-26	Zawarcie z Wykonawcą Umowy DW 614	I-VI
9.	2021.06.21	Przesłanie do UMWM w W-wie skanów załączników do umowy o dofinansowanie projektu zawartej z MJWPU	
10.	2021-06-29	Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej	I-VI
11.	2021-07-05	Sprzeciw Zamawiającego do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo	I-IV,V,Vla branża drogowa
12.	06.07.2021	Zaproszenie na Radę Budowy na dzień 07.07.2021r.	
13.	07.07.2021	Rada Budowy	
14.	2021-07-15	Wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, oświadczeń lub dokumentów w przedmiocie zmiany osoby pełniącej funkcję projektanta branży drogowej	I-IV,V,Vla branża drogowa
15.	2021-07-27	Stanowisko Zamawiającego ws. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia	I-VI
16.	29.07.2021	Brak zgody na formie zgłoszenia budowy	
17.	2021-08-18	Wezwanie Wykonawcy o przedłożenie uzupełnionych polis oraz dowodów opłacenia składek	I-VI



18.	24.08.2021	Do Rejonu Drogowego w Ostrołęce Wniosek o stanowisko w sprawie zaprojektowania obiektu mostowego lub przepustu	
19.	25.08.2021	Wniosek do UMWM o wprowadzenie zmian do umowy dotyczącej przekazania dotacji polegających na wprowadzeniu do zakresu rzeczowego objętego umową pozycji "Wykup gruntu" oraz zwiększenia dotacji na "Roboty budowlane"	
20.	26.08.2021	Stanowisko w sprawie odstąpienia/rezygnacji z wykonania obramowania nawierzchni jezdni krawężnikami betonowymi	
21.	26.08.2021	Do wykonawcy-informacja o wniesieniu do MZDW pisma,, Stanowisko w sprawie zaprojektowania obiektu mostowego lub przepustu" w sprawie zaprojektowania i budowy obiektu na rz. Płodownica	
22.	26.08.2021	Wezwanie Wykonawcy do poprawy Harmonogramu Prac Projektowych	
23.	30.08.2021	Udostępnienie Wykonawcy projektu stałej organizacji ruchu	
24.	2021-08-31	Wystąpienie do Wykonawcy o rozbicie ceny ryczałtowej	I-VI
25.	01.09.2021	Informacja do Wykonawcy w sprawie oczekiwań i potrzeb użytkowników drogi	
26.	2021-09-02	Wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w sprawie doświadczenia osoby, którą Wykonawca zamierza skierować do pełnienia funkcji projektanta branży drogowej w zw. ze zmianą tej osoby	I-IV,V,VIa branża drogowa
27.	02.09.2021	Wystąpienie do Wykonawcy o dane do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia i wystąpienia o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia	
28.	02.09.2021	Wystąpienie o schemat organizacyjny zespołu Wykonawcy	
29.	02.09.2021	Przekazanie Wykonawcy Mapy ewidencyjnej	
30.	2021-09-07	Wezwanie do Wykonawcy o przedstawienie raportów miesięcznych	I-VI



31.	14.09.2021	Drugie Wezwanie Wykonawcy do złożenia Harmonogramu Prac Projektowych	
32.	2021-09-15	Pełnomocnictwo udzielone przez Powiat Przasnyski Prezesowi Zarządu PRDM Ostrada Sp. z o.o. do reprezentacji Powiatu w postępowaniach administracyjnych we wszystkich sprawach zw. z uzyskaniem zgód, pozwoleń, decyzji, niezbędnych do opracowania dokumentacji geodezyjnej, projektowej dot. budowy i rozbudowy odcinka DW614	I-VI
33.	16.09.2021	Do Wykonawcy Informacja o lokalizacji lini kablowej światłowodowej	
34.	2021-09-20	Ponowne wystąpienie do Wykonawcy o rozbicie ceny ryczałtowej	I-VI
35.	20.09.2021	Ponowne wystąpienie do Wykonawcy o rozbicie ceny ryczałtowej	
36.	2021-09-22	Brak akceptacji przez Zamawiającego umowy cesji wierzytelności - Drogowiec Sp. z o.o.	I-IV, V, VIa branża drogowa
37.	2021-09-22	Akceptacja przez Zamawiającego zaproponowanej przez Wykonawcę zmiany osoby pełniącej funkcję projektanta branży drogowej	I-IV, V, VIa branża drogowa
38.	2021-09-22	Pełnomocnictwo udzielone przez Powiat Przasnyski Prezesowi Zarządu Drogowiec Sp. z o.o. - Podwykonawcy do reprezentacji Powiatu w postępowaniach administracyjnych we wszystkich sprawach zw. z uzyskaniem zgód, pozwoleń, decyzji, niezbędnych do opracowania dokumentacji geodezyjnej, projektowej dot. budowy i rozbudowy odcinka DW614	I-VI



39.	22.09.2021	Wystąpienie do MJWPU o wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu poprzez m.in. przesunięcie wydatków pomiędzy III i IV kwartałem 2020 r., przesunięcie wydatków pomiędzy III i IV kwartałem 2021 r., zaplanowanych na 2021 r. na 2022 r.	
40.	2021-09-30	Zgodnie z Umową DW614 Kamień Milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej („ZRID”)/lub złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę („PnB”)	I-VI
41.	02.10.2021	Uzupełnienie do pisma z dnia 19.10.2021 r. o wyrażeniu zgody na zaprojektowanie przepustu w miejscu mostu na kanale Płodownica	
42.	04.10.2021	Wezwanie Wykonawcy do natychmiastowego przedłożenia Harmonogramu Prac Projektowych	
43.	2021-10-05	Drugie wystąpienie do Wykonawcy o przedłożenie uzupełnionych polis oraz dowodów opłacenia składek	I-VI
44.	2021-10-06	Wystąpienie do Wykonawcy o sporządzenie wniosku w sprawie pełnomocnictwa dla Pana G. Borowego oraz złożenie umowy o podwykonawstwo branży mostowej	IV, VIb branża mostowa
45.	2021-10-06	Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu do Zarządu Powiatu Przasnyskiego o udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy, Podwykonawcy wykonującego dokumentację projektową dla branży drogowej	I-VI
46.	2021-10-08	Pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego Prezesowi Zarządu PRDM Ostrada Sp. z o.o. do reprezentacji Powiatu w postępowaniach administracyjnych we wszystkich sprawach zw. z uzyskaniem zgód, pozwoleń, decyzji, niezbędnych do opracowania dokumentacji geodezyjnej, projektowej dot. budowy i rozbudowy odcinka DW614	I-VI



47.	2021-10-08	Pełnomocnictwo udzielone przez Powiat Przasnyski Prezesowi Zarządu Drogowiec Sp. z o.o. - Podwykonawcy do reprezentacji Powiatu w postępowaniach administracyjnych we wszystkich sprawach zw. z uzyskaniem zgód, pozwoleń, decyzji, niezbędnych do opracowania dokumentacji geodezyjnej, projektowej dot. budowy i rozbudowy odcinka DW614	I-VI
48.	2021-10-08	Wystąpienie o skorygowanie i uzupełnienie przez Wykonawcę wniosku o udzielenie pełnomocnictwa dla Pana G. Borowego	IV, VIb branża mostowa
49.	2021-10-18	Ponowne wystąpienie o rozbicie ceny ryczałtowej, wprowadzenie zmian do umowy o podwykonawstwo nr 1/0203/21 oraz uzupełnienie schematu organizacyjnego zespołu Wykonawcy	I-VI
50.	2021-10-19	Wezwanie Wykonawcy do przedstawienia brakujących raportów miesięcznych za miesiąc: czerwiec-wrzesień 2021 r. oraz żądanie Raportu Interwencyjnego	I-VI
51.	19.10.2021	Do Wykonawcy Wyrażenie zgody na zaprojektowanie przepustu w miejscu mostu na kanale Płodownica	
52.	19.10.2021	Wezwanie Wykonawcy do złożenia Wniosku o podział na odcinki ZRID ( z podaniem kilometraża oraz terminem składania Wniosków o wydanie decyzji ZRID)	
53.	2021-10-21	Odmowa przyjmowania przez Zamawiającego od Wykonawcy korespondencji, której adresatem nie jest Zamawiający	I-VI
54.	22.10.2021	Informacja do Wykonawcy o błędnym określeniu inwestora	
55.	29.10.2021	Udostępnienie Wykonawcy elementu dokumentacji projektowej (PZT skrzyżowań DW614 z Przasnyską Strefą Gospodarczą, podstrefa Chorzele 1)	
56.	29.10.2021	Zaproszenie na Radę Budowy na dzień 03.11.2021r.	
57.	05.11.2021	Do Wykonawcy Odmowa przyjmowania korespondencji, która nie jest skierowana do Zamawiającego	





47.	2021-10-08	Pełnomocnictwo udzielone przez Powiat Przasnyski Prezesowi Zarządu Drogowiec Sp. z o.o. - Podwykonawcy do reprezentacji Powiatu w postępowaniach administracyjnych we wszystkich sprawach zw. z uzyskaniem zgód, pozwoleń, decyzji, niezbędnych do opracowania dokumentacji geodezyjnej, projektowej dot. budowy i rozbudowy odcinka DW614	I-VI
48.	2021-10-08	Wystąpienie o skorygowanie i uzupełnienie przez Wykonawcę wniosku o udzielenie pełnomocnictwa dla Pana G. Borowego	IV, VIb branża mostowa
49.	2021-10-18	Ponowne wystąpienie o rozbicie ceny ryczałtowej, wprowadzenie zmian do umowy o podwykonawstwo nr 1/0203/21 oraz uzupełnienie schematu organizacyjnego zespołu Wykonawcy	I-VI
50.	2021-10-19	Wezwanie Wykonawcy do przedstawienia brakujących raportów miesięcznych za miesiąc: czerwiec-wrzesień 2021 r. oraz żądanie Raportu Interwencyjnego	I-VI
51.	19.10.2021	Do Wykonawcy Wyrażenie zgody na zaprojektowanie przepustu w miejscu mostu na kanale Płodownica	
52.	19.10.2021	Wezwanie Wykonawcy do złożenia Wniosku o podział na odcinki ZRID ( z podaniem kilometraża oraz terminem składania Wniosków o wydanie decyzji ZRID)	
53.	2021-10-21	Odmowa przyjmowania przez Zamawiającego od Wykonawcy korespondencji, której adresatem nie jest Zamawiający	I-VI
54.	22.10.2021	Informacja do Wykonawcy o błędnym określeniu inwestora	
55.	29.10.2021	Udostępnienie Wykonawcy elementu dokumentacji projektowej (PZT skrzyżowań DW614 z Przasnyską Strefą Gospodarczą, podstrefa Chorzele 1)	
56.	29.10.2021	Zaproszenie na Radę Budowy na dzień 03.11.2021r.	
57.	05.11.2021	Do Wykonawcy Odmowa przyjmowania korespondencji, która nie jest skierowana do Zamawiającego	



47.	2021-10-08	Pełnomocnictwo udzielone przez Powiat Przasnyski Prezesowi Zarządu Drogowiec Sp. z o.o. - Podwykonawcy do reprezentacji Powiatu w postępowaniach administracyjnych we wszystkich sprawach zw. z uzyskaniem zgód, pozwoleń, decyzji, niezbędnych do opracowania dokumentacji geodezyjnej, projektowej dot. budowy i rozbudowy odcinka DW614	I-VI
48.	2021-10-08	Wystąpienie o skorygowanie i uzupełnienie przez Wykonawcę wniosku o udzielenie pełnomocnictwa dla Pana G. Borowego	IV, VIb branża mostowa
49.	2021-10-18	Ponowne wystąpienie o rozbicie ceny ryczałtowej, wprowadzenie zmian do umowy o podwykonawstwo nr 1/0203/21 oraz uzupełnienie schematu organizacyjnego zespołu Wykonawcy	I-VI
50.	2021-10-19	Wezwanie Wykonawcy do przedstawienia brakujących raportów miesięcznych za miesiąc: czerwiec-wrzesień 2021 r. oraz żądanie Raportu Interwencyjnego	I-VI
51.	19.10.2021	Do Wykonawcy Wyrażenie zgody na zaprojektowanie przepustu w miejscu mostu na kanale Płodownica	
52.	19.10.2021	Wezwanie Wykonawcy do złożenia Wniosku o podział na odcinki ZRID ( z podaniem kilometraża oraz terminem składania Wniosków o wydanie decyzji ZRID)	
53.	2021-10-21	Odmowa przyjmowania przez Zamawiającego od Wykonawcy korespondencji, której adresatem nie jest Zamawiający	I-VI
54.	22.10.2021	Informacja do Wykonawcy o błędnym określeniu inwestora	
55.	29.10.2021	Udostępnienie Wykonawcy elementu dokumentacji projektowej (PZT skrzyżowań DW614 z Przasnyską Strefą Gospodarczą, podstrefa Chorzele 1)	
56.	29.10.2021	Zaproszenie na Radę Budowy na dzień 03.11.2021r.	
57.	05.11.2021	Do Wykonawcy Odmowa przyjmowania korespondencji, która nie jest skierowana do Zamawiającego	



58.	2021-11-09	Infomacja skierowana do Wykonawcy dotycząca opóźnień w realizacji etapów Umowy DW614	I-VI
59.	2021-11-09	Ponowne wezwanie Wykonawcy do przedstawienia brakujących raportów miesięcznych za miesiąc: czerwiec-wrzesień 2021 r. oraz żądanie Raportu Interwencyjnego	I-VI
60.	09.11.2021	Wystąpienie do Wykonawcy o usunięcie omyłki pisarskiej we Wniosku o wydanie warunków technicznych	
61.	2021-11-15	Zgodnie z Umową Kamień Milowy nr 2: złożenie Koordynatorowi Projektu kompletnych projektów wykonawczych, w tym szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót – w terminie do dnia 15.11 2021 roku, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych	I-VI
62.	2021-11-17	Odmowa akceptacji zmiany Umowy DW614	I-VI
63.	17.11.2021	Wystąpienie do MJWPU z propozycją etapowania realizacji umowy w części projektowej	
64.	2021-11-29	Infomacja skierowana do Wykonawcy dotycząca opóźnień w realizacji Kamienia Milowego nr 2 w ramach Umowy DW614	I-VI
65.	02.12.2021	Zaproszenie na Radę Budowy na dzień 08.12.2021r.	
66.	2021-12-10	Opinia prawna sporządzona przez r.pr. P. Skrodzkiego (Jerzy Pieróg i Partnerzy Kancelaria Prawna) na zlecenie Zamawiającego w przedmiocie oceny dopuszczalności przelewu wierzytelności przez Wykonawcę na Podwykonawcę w sytuacji, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego jest tworzone poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy	I-VI



67.	21.12.2021	Wystąpienie do MJWPU o wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu poprzez m.in. przesunięcie wydatków z 2021 na 2022 r., przesunięciu wydatków pomiędzy kwartałami 2022 r.	
68.	21.12.2021	Wystąpienie do UMWM w W-wie z wnioskiem o zmianę budżetu zadania	
69.	29.12.2021	Do Wykonawcy Informacja dotycząca obiektów inżynierskich o zgodzie na przekazanie koncepcji obiektów inżynierskich do MZDW oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego	
70.	30.12.2021	Stanowisko dotyczące rozwiązań projektowych- rozwiązań przedstawiających lokalizację oraz wylotu projektowanej kanalizacji deszczowej	
71.	01.01.2022	Zaproszenie na Radę Budowy na dzień 12.01.2022r.	
72.	2022-01-10	Podsumowanie Zamawiającego przed spotaniem mediacyjnym	I-VI
73.	10.01.2022	Przekazanie do Wykonawcy Wniosku mieszkańca m.Krukowo	
74.	2022-01-12	Zgoda na zawarcie umowy cesji wierzytelności - Podwykonawca Drogowiec Sp. z o.o.	I-IV,V,VIa branża drogowa
75.	01.02.2022	Przekazanie do Wykonawcy warunków przyłączenia do sieci przepompownia wód opadowych	
76.	2022-02-04	Wezwanie Wykonawcy do aktualizacji Harmonogramu Prac Projektowych	I-VI
77.	2022-02-04	Wystąpienie do Wykonawcy o rozbicie ceny ryczałtowej	I-VI
78.	04.02.2022	Ponowne przekazanie do Wykonawcy Wniosku mieszkańca m.Krukowo	
79.	07.02.2022	Zaproszenie na Radę Budowy na dzień 10.02.2022r.	
80.	07.02.2022	Przesłanie do Wykonawcy Harmonogramu Rad Budowy	
81.	10.02.2022	Rada Budowy	



82.	2022-02-16	Odpowiedź na wnioski Wykonawcy o zmianę Umowy DW614 w przedmiocie: 1) zmian kalkulacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zw. ze zmianą oszacowania wartości prac projektowych, nadzoru autorskiego i robót budowlanych branży mostowej, 2) zmiany sposobu płatności na podstawie faktur częściowych za wykonania robót geodezyjnych i projektowych w wyniku ich podziału na odcinki,	I-VI
83.	2022-02-18	Odmowa zatwierdzenia przez Zamawiającego aktualizacji Harmonogramu Prac Projektowych	I-VI
84.	2022-02-28	1. Uzgodnienie przez Zamawiającego Harmonogramu obrazującego najkrótszy czas wykonania prac projektowych 2. Wezwanie Wykonawcy do określenia realnych terminów wykonania robót budowlanych w ramach etapów 3. Żądanie od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo na wykonanie robót branży mostowej	I-VI
85.	03.03.2022	Wezwanie Wykonawcy do złożenia Wniosku o zmianę podziału inwestycji na odcinki	
86.	03.03.2022	Rada Budowy	
87.	2022-03-21	Akceptacja wniosku Wykonawcy o zmianę Umowy w zakresie Kamieni Miłowych nr 1 i nr 2 wraz z przekazaniem Wykonawcy projektu Aneksu w przedmiotowej sprawie wraz z załącznikiem - Harmonogram Prac Projektowych	I-VI
88.	31.03.2022	Zaproszenie na Radę Budowy na dzień 04.04.2022r.	
89.	31.03.2022	Uwagi do Wykonawcy dotyczące zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu	



90.	2022-04-04	Zawarcie z Wykonawcą Aneksu nr 1 zmieniającego: 1) terminy wykonania przez Wykonawcę Kamieni Milowych nr 1 i nr 2 2) zmianę kalkulacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zw. ze zmianą oszacowania wartości prac projektowych, nadzoru autorskiego i robót budowlanych branży mostowej 2) zmiany sposobu płatności na podstawie faktur częściowych za wykonania robót geodezyjnych i projektowych w wyniku ich podziału na odcinki	I-VI
91.	04.04.2022	Rada Budowy	
92.	06.04.2022	Wystąpienie do MJWPU o wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu poprzez m.in. Przesunięcie wydatków z IV kwartału 2021 r. na 2022 r., pomiędzy kwartałami 2022 r.	
93.	08.04.2022	Stanowisko dotyczące konstrukcji warstwy wiążącej na obiektach inżynierskich	
94.	13.04.2022	Przekazanie do Wykonawcy Wniosku mieszkańca m. Zaręby urzytkownika DW614 o uwzględnienie zjazdu	
95.	15.04.2022	Wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 2- km 2+474,80-2+750,00”	II
96.	15.04.2022	Wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 3- km 3+810,00-6+829,30”	III
97.	15.04.2022	Wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 5-km 10+920,70-15+630,00	V



98.	21.04.2022	Zastrzeżenia do Wykonawcy do przekazanej dokumentacji- Projekt Budowlany - Odcinek 2,3,5	II,III,V
99.	29.04.2022	Protokół Odbioru Częściowego nr 414.1.2022.DW614- Prace Geodezyjne Odcinek nr 1,2,3,4,5,6 ; Prace projektowe obejmujące Projekt Budowlany w tym Plan Zagospodarowania terenu, Projekt Architektoniczno- Budowlany dla Odcinka nr 2,3,5	I,II,III,IV,V,VI
100.	29.04.2022	Zaproszenie na Radę Budowy na dzień 05.05.2022r.	
101.	2022-05-04	Zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy DW614 zmiana terminu osiągnięcia Kamienia Milowego nr 1: złożenie do właściwego organu administracji publicznej kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej („ZRID”)/lub złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę(„PnB”) do 04.05.2022 r.	I-VI
102.	05.05.2022	Wniosku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.„ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 1- km 0+000,00-2+474,80 oraz 2+474,80 oraz 2+750,00-3+810,00"	I
103.	05.05.2022	Wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 4 km 6+829,30-10+920,70"	IV
104.	05.05.2022	Wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 6 km 15+630,00-17+433,00"	VI w zakresie km 15+630-17+433,00



105.	05.05.2022	Wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn., Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 6- km 17+433,00-17+533,00"	VI w zakresie km 17+433,00-17+533,00
106.	05.05.2022	Rada Budowy	
107.	06.05.2022	Wystąpienie do MJWPU o wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu polegających na zwiększeniu wydatku "Opracowanie dokumentacji technicznej" i wydatku "Nadzór autorski" i pomniejszeniu wydatku "Roboty budowlane" po podpisaniu aneksu do umowy o roboty budowlane	
108.	11.05.2022	Wystąpienie do UMWM w W-wie z wnioskiem o zmianę budżetu zadania	
109.	2022-05-12	Zastrzeżenia Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo - Domost Sp. z o.o.	IV,VIb branża mostowa
110.	18.05.2022	Zwrot faktury VAT nr 1/5/2022 z uwagi na niewłaściwe określenie "towaru lub usługi" oraz braki wymienione w zał. Do POC 414.1.2022.DW614	II, III, V
111.	2022-05-19	Wystąpienie do Wykonawcy o schemat organizacyjny Wykonawcy	I-VI
112.	20.05.2022	Odrzucenie zawiadomienia o gotowości do odbioru- Kompletny projekt budowlany w tym Plan Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany dla odcinka nr 1,4,6	I,IV,VI
113.	20.05.2022	Wezwanie Wykonawcy do Uzupełnienia braków do Wniosku ZRID- Odcinek nr 3	III
114.	20.05.2022	Wezwanie Wykonawcy do Uzupełnienia braków do Wniosku ZRID- Odcinek nr 2	II
115.	20.05.2022	Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia braków do Wniosku ZRID dla odcinka nr 5	V
116.	23.05.2022	Przekazanie Faktury VAT nr 1/5/2022 z załącznikami do WFB Starostwa Powiatowego	
117.	2022-05-27	Zastrzeżenia Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo - Domost Sp. z o.o.	IV,VIb branża mostowa
118.	2022-05-27	Akceptacja Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo - Domost Sp. z o.o.	IV,VIb branża mostowa





119.	2022-05-27	Zgodnie z Aneksem nr 2 do Umowy DW614 zmiana terminu osiągnięcia Kamienia Milowego nr 2 : złożenie Koordynatorowi Projektu kompletnych projektów wykonawczych, w tym szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót do 27.05.2022 r.	I-VI
120.	27.05.2022	Uzupełnienie do Wojewody Mazowieckiego braków we Wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 2- km 2+474,80-2+750,00"	II
121.	27.05.2022	Usunięcie braków w Urzędzie Wojewódzkim we Wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.„ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 3- km 3+810,00-6+829,30"	III
122.	27.05.2022	Usunięcie braków w Urzędzie Wojewódzkim we Wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.„ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 5- km 10+920,70-15+630,00	V
123.	02.06.2022	Wezwanie do Wykonawcy do usunięcia braków we Wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 6 km 15+630,00-17+433,00	VI w zakresie km 15+630-17+433,00
124.	02.06.2022	Zaproszenie na Radę Budowy na dzień 06.06.2022r.	
125.	03.06.2022	Wystąpienie do UMWM w W-wie z wnioskiem o zmianę budżetu zadania i aneksowanie umowy o dofinansowanie	
126.	05.06.2022	Zaproszenie na Radę Budowy na dzień 07.07.2022r.	



127.	06.06.2022	Rada Budowy	
128.	06.06.2022	Zaproszenie na Radę Budowy na dzień 07.07.2022r. (Wniosek o przygotowanie dokumentów które powinny stanowić odpowiedź na Wezwanie Wojewody Mazowieckiego	
129.	09.06.2022	Do Wykonawcy Odrzucenie zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru w zakresie całości Projektu Wykonawczego /Technicznego na odcinku nr 1,2,3,4,5,6	I,II,III,IV,V,VI
130.	15.06.2022	Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia z faktury RD/0037/2022 wystawionej na kwotę 354 240,00 zł do czasu usunięcia nieprawidłowości dokumentacji i dokonania odbioru oraz złożenia in. Dokumentów wymienionych w par. 7 ust. 13 i 13 umowy o roboty budowlane	
131.	2022-06-21	Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ramach DW614	I-VI
132.	21.06.2022	Przekazanie do Wykonawcy Wezwań Wojewody Mazowieckiego dotyczące uzupełnienia dokumentów dla Odcinka nr 2,4,5,6	II,IV,V,VI
133.	21.06.2022	Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia braków we Wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka nr 3	III
134.	24.06.2022	Wniosek Zarządu Powiatu Przasnyskiego do Wojewody Mazowieckiego o wydłużenie terminu uzupełnienia braków o 30 dni Wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 1- km 0+000,00-2+474,80 oraz 2+474,80 oraz 2+750,00-3+810,00" na Wniosek Pełnomocnika Inwestora.	I
135.	24.06.2022	Prośba Zarządu Powiatu Przasnyskiego o wydłużenie terminu uzupełnienia braków we w Wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 6 km 15+630,00-17+433,00	VI w zakresie km 15+630-17+433,00



136.	28.06.2022	Przekazanie faktury Nr RD/0037/2022 do WFB SP w P-szu	
137.	2022-06-29	Ponowne wezwanie do uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ramach Umowy DW614	I-VI
138.	07.07.2022	Rada Budowy	
139.	13.07.2022	Uzupełnienie do Wojewody braków we Wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 4- km 6+829,30-10+920,70	IV
140.	13.07.2022	Uzupełnienie do Wojewody Mazowieckiego braków we Wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 6 km 17+433,00-17+533,00	VI w zakresie km 17+433,00-17+533,00
141.	2022-07-14	Zawarcie z Wykonawcą Aneksu nr 2 zmieniającego Harmonogram Prac Projektowych (Załącznik do Aneksu) poprzez uwzględnienie wartości prac za wykonanie dokumentacji technicznej branży mostowej	IV-VIb branża mostowa
142.	14.07.2022	Wniosek Zarządu Powiatu Przasnyskiego do Wojewody Mazowieckiego o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.„ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyn- Odcinek nr 1- km 0+000,00-2+474,80 oraz 2+474,80 oraz 2+750,00-3+810,00 na Wniosek Wykonawcy	I
143.	14.07.2022	Uzupełnieni do Wojewody Mazowieckiego braków we Wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 2- km 2+474,80-2+750,00"	II



144.	14.07.2022	Uzupełnienie do Wojewody Mazowieckiego braków we Wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn., Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 3- km 3+810,00-6+829,30"	III
145.	14.07.2022	Uzupełnienie do Wojewody Mazowieckiego braków we Wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn., Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec- Odcinek nr 5- km 10+920,70- 15+630,00"	V
146.	14.07.2022	Uzupełnienie do Wojewody Mazowieckiego braków we Wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 6 km 15+630,00-17+433,00	VI w zakresie km 15+630-17+433,00
147.	2022-07-18	Informacja o braku zgody na przelew wierzytelności - Podwykonawca Domost Sp. z o.o.	IV-VIb branża mostowa
148.	22.07.2022	Zwrot faktury Nr RD/0037/2022 Wykonawcy (brak usunięcia nieprawidłowości dokumentacji oraz przedłożenia dokumentów do odbioru i zapłaty)	
149.	26.07.2022	Informacja do Wykonawcy o nie zaprojektowaniu zjazdu	
150.	28.07.2022	Uzupełnienie do Wojewody Mazowieckiego braków we Wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn., Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo- Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele- Odcinek nr 4- km 6+829,30-10+920,70"	IV
151.	2022-07-29	Trzecie wezwanie do uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ramach DW614	I-VI
152.	2022-07-30	Zgodnie z Umową Kamień Milowy nr 3: wykonanie do dnia 30.07.2022 roku robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 13.500.000,00 PLN do 30.07.2022	I-VI



153.	05.08.2022	Zaproszenie na Radę Budowy na dzień 08.08.2022r.	
154.	08.08.2022	Rada Budowy	
155.	09.08.2022	Przekazanie Faktury Nr RD/0037/2022 wraz z Fakturą korygującą Nr KBD/003/2022 do WFB SP w P-szu	
156.	22.08.2022	Nałożenie na Wykonawcę obowiązku uzupełnienia Projektu Budowlanego dla Odcinka nr 2	II
157.	2022-09-02	Wezwanie Wykonawcy do przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy - Drogowiec Sp. z o.o.	I-IV,V,VI branża drogowa
158.	02.09.2022	Uzupełnienie Projektu Budowlanego dla Odcinka nr 2 w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim	II
159.	2022-09-06	Wezwanie Wykonawcy do złożenia szczegółowego rozbięcia ceny ryczałtowej	I-VI
160.	06.09.2022	Stanowisko Powiatu Przasnyskiego w sprawie zawarcia aneksu nr 8/2022 do umowy nr 45/UMWM/02/2019/NW-I-II/D z dnia 12.03.2019	
161.	07.09.2022	Wezwanie wykonawcy do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy - Drogowiec Sp. z o.o.	II, III, V
162.	08.09.2022	Wezwanie do Wykonawcy: 1. Wezwanie do potwierdzenia usunięcia braków istotnych Projektu Budowlanego dla odcinka nr 1,4,6; 2. Wezwanie do złożenia dokumentów dla Odcinka nr 2,3,5	I,II,III,IV,V,VI
163.	08.09.2022	Informacja w sprawie Rady Budowy	
164.	09.09.2022	Protokół Odbioru Częściowego- Prace projektowe obejmujące Projekt Budowlany w tym Plan Zagospodarowania terenu, Projekt Architektoniczno- Budowlany dla Odcinka nr 1,4,6	I,IV,VI
165.	13.09.2022	Nałożenie na Wykonawcę obowiązku uzupełnienia Projektu Budowlanego dla Odcinka nr 5	V



166.	14.09.2022	Wezwanie Wykonawcy do przygotowania Wniosku ZRID i dokumentów po pozostawieniu przez organ sprawy bez rozpatrzenia: Odcinek nr 6 km 17+433,00- 17+533,00	VI w zakresie km 17+433-17+533,00
167.	16.09.2022	Propozycja zmiany zakresu rzeczowego po konsultacjach z Projektantami	
168.	19.09.2022	Wezwanie Podwykonawcy Drogowiec Sp. z o.o. do złożenia dokumentów do pisemnego żądania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia	I-VI II, III, V
169.	19.09.2022	Wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnień dla odcinka nr 6- km 15+630,00- 17+533,00 w zakresie od km 15+630,00 do km 17+433,00	VI w zakresie km 15+630-17+433,00
170.	19.09.2022	Nałożenie na Wykonawcę obowiązku wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji projektowej dla Odcinka nr 6- km 15+630,00- 17+433,00	VI w zakresie km 15+630-17+433,00
171.	21.09.2022	Przesłanie Załącznika nr 8 Podwykonawcy	
172.	21.09.2022	Przesłanie uwag Podwykonawcy do złożonych dokumentów: brak podpisu elektronicznego na przesłanych dokumentach oraz informacji o przekazaniu dokumentów Wykonawcy i odebraniu ich przez Wykonawcę	
173.	22.09.2022	Przesłanie projektu aneksu nr 7 i 8 przedstawicielom Powiatu celem zapoznania się z ich treścią i akceptacji	
174.	23.09.2022	Ponowne Wezwanie Wykonawcy do przygotowania Wniosku ZRID i dokumentów po pozostawieniu przez organ sprawy bez rozpatrzenia dla Odcinka nr 6 km 17+433,00 do km 17+533,00	VI w zakresie km 17+433-17+533,00
175.	26.09.2022	Uzupełnienie do Wojewody Mazowieckiego Projektu Budowlanego dla Odcinka nr 5	V
176.	29.09.2022	Opinia Radcy Prawnego S. Kwietniaka dot. zapłaty wynagrodzenia 566 046,00 zł	
177.	30.09.2022	Wiadomość do wykonawcy z prośbą o przekazanie dokumentów potwierdzających wykonanie usługi przez Podwykonawcę , tj. faktur, protokołów odbioru	



178.	03.10.2022	Nałożenie na Wykonawcę obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości i braków Projektu Budowlanego dla Odcinka nr 3-km 3+810,00-6+829,30	III
179.	03.10.2022	Wezwanie Wykonawcy do usunięcia braków we Wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Odcinka nr 3-km 3+810,00-6+829,30	III
180.	04.10.2022	Wniosek nr 1 o wypłatę dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego	
181.	05.10.2022	Uzupełnienie do Wojewody Mazowieckiego nieprawidłowości i braków Projektu Budowlanego dla odcinka nr 6- km 15+630,00- 17+533,00 w zakresie od km 15+630,00 do km 17+433,00	VI w zakresie km 15+630-17+433,00
182.	05.10.2022	Wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Odcinka nr 6-km 15+630,00-17+533,00 w zakresie od km 17+433,00 do km 17+533,00	VI w zakresie km 17+433-17+533,00
183.	06.10.2022	Nałożenie na Wykonawce obowiązku wyjaśnień i uzupełnień do Wniosku o Wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Odcinka nr 3-km 3+810,00- 6+829,30	III
184.	07.10.2022	Zaproszenie na Radę Budowy na dzień 10.10.2022r.	
185.	10.10.2022	Wezwanie wykonawcy do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy - Drogowiec Sp. z o.o.	I, IV, VI
186.	10.10.2022	Rada Budowy	
187.	11.10.2022	Wniosek do MJWPU i UMWM w W-wie o udzielenie informacji w zakresie kwalifikowalności wydatków dot. kwoty wierzytelności Podwykonawcy, jaka zostanie bezpośrednio zapłacona Podwykonawcy przez Zamawiającego	
188.	2022-10-14	Wezwanie Wykonawcy do złożenia brakujących raportów miesięcznych za miesiąc: sierpień - wrzesień 2022 r.	I-VI



189.	14.10.2022	Przekazanie żądania dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy z tytułu zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo w wysokości 56 604,60 zł z załącznikami do WFB SP w P-szu	II, III, V
190.	14.10.2022	Wezwanie Wykonawcy o rozpoczęcie robót budowlanych dla Odcinka nr w km 2+474,80-2+750,00	II
191.	18.10.2022	Przekazanie faktury RD/0065/2022 z załącznikami do WFB SP w P-szu	I, IV, VI
192.	20.10.2022	Uzupełnienie do Wojewody Mazowieckiego nieprawidłowości i braków Projektu Budowlanego dla Odcinka nr 3-km 3+810,00- 6+829,30	III
193.	26.10.2022	Nałożenie na Wykonawcę obowiązku wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji projektowej dla Odcinka nr 6 km 15+630,00- 17+433,00	VI w zakresie km 15+630-17+433,00
194.	04.11.2022	Uzupełnienie do Wojewody Mazowieckiego braków we Wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Odcinka nr 6- km 15+630,00- 17+533,00 w zakresie km 17+433,00 do km 17+533,00	VI w zakresie km 17+433-17+533,00
195.	2022-11-08	Wniosek do Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie doręczenia Decyzji nr 223/SPEC/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 7.10.2022 r. (sygn. WI-I.7820.2.17.2022.JB)	II
196.	2022-11-08	Wezwanie Wykonawcy do: 1) złożenia Harmonogramu robót 2) wydania Decyzji nr 223/SPEC/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 7.10.2022 r. (sygn. WI-I.7820.2.17.2022.JB)	II
197.	2022-11-08	Wezwanie Wykonawcy do przejęcia placu budowy w dniu 10.11.2022 r.	II
198.	08.11.2022	Zaproszenie na Radę Budowy na dzień 10.11.2022r.	
199.	10.11.2022	Rada Budowy	





189.	14.10.2022	Przekazanie żądania dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy z tytułu zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo w wysokości 56 604,60 zł z załącznikami do WFB SP w P-szu	II, III, V
190.	14.10.2022	Wezwanie Wykonawcy o rozpoczęcie robót budowlanych dla Odcinka nr w km 2+474,80-2+750,00	II
191.	18.10.2022	Przekazanie faktury RD/0065/2022 z załącznikami do WFB SP w P-szu	I, IV, VI
192.	20.10.2022	Uzupełnienie do Wojewody Mazowieckiego nieprawidłowości i braków Projektu Budowlanego dla Odcinka nr 3-km 3+810,00- 6+829,30	III
193.	26.10.2022	Nałożenie na Wykonawcę obowiązku wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji projektowej dla Odcinka nr 6 km 15+630,00- 17+433,00	VI w zakresie km 15+630-17+433,00
194.	04.11.2022	Uzupełnienie do Wojewody Mazowieckiego braków we Wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Odcinka nr 6- km 15+630,00- 17+533,00 w zakresie km 17+433,00 do km 17+533,00	VI w zakresie km 17+433-17+533,00
195.	2022-11-08	Wniosek do Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie doręczenia Decyzji nr 223/SPEC/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 7.10.2022 r. (sygn. WI-I.7820.2.17.2022.JB)	II
196.	2022-11-08	Wezwanie Wykonawcy do: 1) złożenia Harmonogramu robót 2) wydania Decyzji nr 223/SPEC/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 7.10.2022 r. (sygn. WI-I.7820.2.17.2022.JB)	II
197.	2022-11-08	Wezwanie Wykonawcy do przejęcia placu budowy w dniu 10.11.2022 r.	II
198.	08.11.2022	Zaproszenie na Radę Budowy na dzień 10.11.2022r.	
199.	10.11.2022	Rada Budowy	



200.	14.11.2022	Drugie odrzucenie o osiągnięciu gotowości do obioru- Prace projektowe obejmujące kompletny Projekt Wykonawczy (Projekt Techniczny)+Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla Odcinka nr 1,3,4,5,6	I,III,IV,V,VI
201.	14.11.2022	Akceptacja przez Koordynatora Projektu Projektu Wykonawczego dla Odcinka nr 2	II
202.	15.11.2022	Nałożenie na Wykonawcę obowiązku przedłożenia wyjaśnień dotyczących Projektu Budowlanego dla Odcinka 3- km 3+810,00-6+829,30	III
203.	16.11.2022	Nałożenie na Wykonawcę obowiązku usunięcia braków we Wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Odcinka nr 4- km 6+829,30-10+10+920,70	IV
204.	16.11.2022	Nałożenie na Wykonawcę obowiązku przedłożenia wyjaśnień dotyczących Projektu Budowlanego dla Odcinka 5- km 10+920,70- 15+630,00	V
205.	17.11.2022	Akceptacja aneksów nr 7 i 8 przez Powiat	
206.	24.11.2022	Wystąpienie do UMWM w W-wie z wnioskiem o zmniejszenie dotacji przeznaczonej na 2022 r. i przeniesienie nadwyżki na 2023 r.	
207.	24.11.2022	Protokół odbioru częściowego nr 414.3.2022.DW614 Opracowanie dokumentacji technicznej w tym Projekt Wykonawczy (Projekt Techniczny)+ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Inne- Etap II, Etap III, Etap VI km 15+633,00-17+433,00i w zakresie branży drogowej	II,III,VI w zakresie km 15+630-17+433,00
208.	2022-11-28	Opinia r.pr. S. Kwietniaka dot. cesji wierzytelności zajętej przez komornika w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym przeciwko cedentowi	I-VI
209.	2022-11-29	Ponowna informacja o braku akceptacji umowy cesji wierzytelności - Podwykonawcy Domost Sp.z o.o.	IV-VIb branża mostowa
210.	2022-11-29	Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy DW614	I-VI
211.	07.12.2022	Korekta wniosku nr 1 o wypłatę dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego	
212.	2022-12-08	Wezwanie Prezesa Zarządu PRDM Ostarda Sp.z o.o. do wydania wszelkich posiadanych dokumentów, zgód, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i postanowień uzyskanych w ramach udzielonego pełnomocnictwa z dnia 08.10.2021 r.	I-VI



213.	2022-12-08	Wezwanie Prezesa Zarządu Drogowiec Sp. z o.o. do wydania wszelkich posiadanych dokumentów, zgód, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i postanowień uzyskanych w ramach udzielonego pełnomocnictwa z dnia 08.10.2021 r.	I-VI
214.	08.12.2022	Wniosek nr 2 o wypłatę dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego	
215.	12.12.2022	Wniosek o zmianę rzeczową i finansową projektu do MJWPU	
216.	16.12.2022	Przekazanie do Wojewody Mazowieckiego Opinii z podpisem elektronicznym do Wniosku ZRID dla Odcinka nr 6-km 15+630,00-17+533,00 w zakresie od km 17+433,00 do km 17+533,00	VI w zakresie km 17+433-17+533,00
217.	2022-12-20	Zawarcie z Wykonawcą Umowy nr 253.2.1.2021.2022.DW614 o mediację w sprawie roszczeń wynikających z realizacji Umowy DW614	I-VI
218.	20.12.2022	Uzupełnienie do Wojewody Mazowieckiego braków we Wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Odcinka nr 6 km 15+630,00-17+533,00 w zakresie od km 17+433,00 do km 17+533,00	VI w zakresie km 17+433-17+533,00
219.	27.12.2022	Korekta Wniosku nr 1 i 2 oraz Wniosek nr 3 o wypłatę dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego	
220.	27.12.2022	Prośba do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Odcinka nr 6- km 15+630,00- 17+533,00 w zakresie od km 17+433,00 do km 17+533,00 Zarządowi Powiatu Przasnyskiego	VI w zakresie km 17+433-17+533,00
221.	27.12.2022	Prośba do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Odcinka nr 4- km 6+829,30-10+10+920,70 Zarządowi Powiatu Przasnyskiego	IV



222.	2022-12-29	Odpowiedź Zamawiającego na pismo Wykonawcy z dnia 14.12.2022 r. pt. "OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY"	I-VI
223.	09.01.2023	Rozliczenie dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego otrzymanej w 2022 r.	
224.	2023-01-13	Zawiadomienie o rezygnacji z mediacji przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego	I-VI
225.	16.01.2023	Korekta rozliczenia dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego otrzymanej w 2022 r.	
226.	2023-02-01	Ponowne wezwanie Prezesa Zarządu PRDM Ostarda Sp.z o.o. do wydania wszelkich posiadanych dokumentów, zgód, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i postanowień uzyskanych w ramach udzielonego pełnomocnictwa z dnia 08.10.2021 r.	I-VI
227.	2023-02-01	Ponowne wezwanie Prezesa Zarządu Drogowiec Sp. z o.o. do wydania wszelkich posiadanych dokumentów, zgód, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i postanowień uzyskanych w ramach udzielonego pełnomocnictwa z dnia 08.10.2021 r.	I-VI
228.	2023-02-06	Opinia prawna sporządzona (Mitek Dachowski Kancelaria Prawna) w przedmiocie oceny w zakresie skutków zawarcia, wykonywania o odstąpienia od Umowy DW614	I-VI
229.	06.02.2023	Wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie zaświadczenia o ostateczności Decyzji ZRID dla Odcinka nr 2,3,4,5,6	II,III,IV,V,VI
230.	01.03.2023	Wezwanie Pełnomocnika Inwestora (Podwykonawcy) do złożenia wyjaśnień w sprawie wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Odcinek nr 5-km 10+920,70-15+630	V
231.	13/14-16.12.2022	Wystąpienia do Ubezpieczyciela w przedmiocie zapłaty przez Wykonawcę rat składek ubezpieczeniowych w ramach polis ubezpieczeniowych	I-VI



POWIAT  
PRZASNYSKI

**DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.**

